

明けましておめでとうございます。新年を迎え、新たなお気持ちでお過ごしのことと存じます。本年も新東名高速道路事業にご協力賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

用沢工事では、1月も引続き、本線土工事、調整池工事、付替道路工事などを実施致します。本年も土運搬作業を継続して実施する計画となっており、また、昨年末に町道用沢大御神線の切替を行ったところですが、今後、工事の進捗に合わせて、町道阿多野大御神線、町道原向中日向線などにおいても交通規制を伴う工事を計画しております。工事関係車両の往来や交通規制等により、地域の皆様にはご迷惑をお掛けすることと存じますが、引続き、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。

お気づきの点などがございましたら、下記連絡先までご連絡お願い致します。

## 2024年1月の予定

- 掘削・土運搬・盛土(本線、小山PA下り、大御神東跨道橋～須川支流1付近)
- 調整池工(須川、小山PA下り)
- 付替道路工(県道須走小山線、町道3780号線、町道3975号線、町道用沢大御神線)
- 付替道路工(町道3628号線、町道阿多野大御神線、町道原向中日向線、町道3106号線)

## ●主な工事車両運行予定

- 大型車  
10tトラック・ユニック車、トレーラー、10tダンプ(30～50台)  
生コン車、移動式クレーン
- 小型車、中型車  
資機材搬入・搬出車  
2～4tダンプ・トラック・ユニック車、散水車、連絡車両

## ●主な使用機械

- 移動式クレーン(25～50t級:1～3台)
- バックホウ(0.15～1.4m<sup>3</sup>級:20台程度)
- コンクリートポンプ車(8～12t車)



## 状況写真

工事進捗率 95.0%(2023.12末)

① 県道須走小山線周辺

町道の道路工事状況

② 飛球防護対策工事

ボックスカルバートの頂版を施工中

③ 用沢跨道橋周辺

プレキャスト法柱工の施工状況

④ 町道用沢大御神線

本線(旧迂回路部)の掘削状況


⑤ PC上部工工事  
大御神西跨道橋

橋梁が完成しました。

⑥ 上野地区

湯船原トンネル西坑口周辺

## 工事平面図【小山地区】

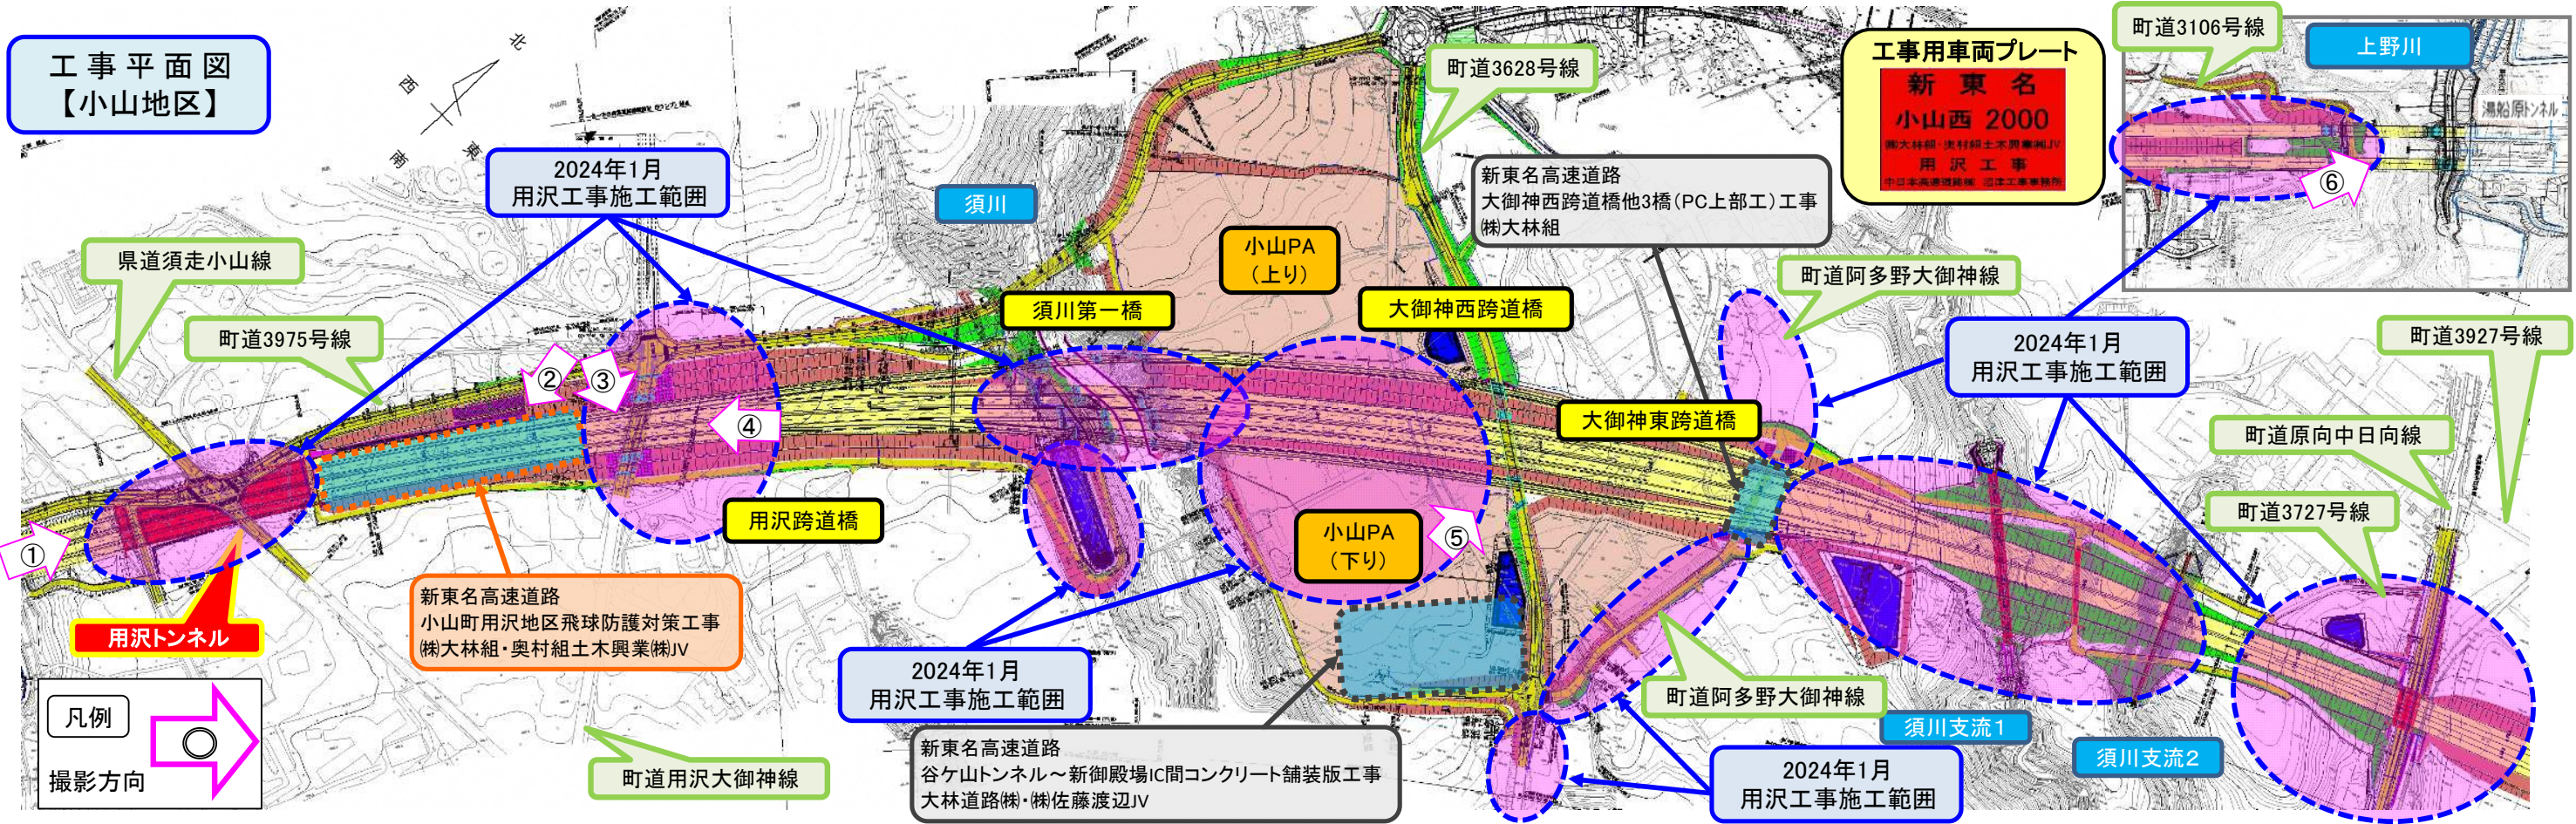

ごあいさつ

皆様におかれましては、日頃より新東名建設事業に対してのご理解とご協力を頂き、深く感謝しております。

当工事は、2015年10月末に工事を受注し、皆様のご理解・ご協力のもと、8年もの期間を経て、2023年12月末に工事を完了することができました。

今月(1月)は不要資材の搬出、2月には検査等を予定しています。引き続き、車両の運行マナー、ルールを遵守いたします。

近隣では関連工事が行われていますが、引き続き、ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

なお、当該工事ニュースは、今回をもちまして終了とさせていただきますことをご了承ください。

2024年1月の工事内容(小山町上野)

- 工事無し
- 不要資材の搬出

※主な工事車両運行予定  
資材運搬車

※主な使用機械  
なし

**新東名**  
**小山西 1000**  
 西松建設株式会社  
 湯船原トンネル工事  
中日本高速道路株式会社 沼津工事事務所  
 ●工事用車両プレート

●2024年1月度施工無し

●施工範囲




●状況写真



①本線



②トンネル西坑口

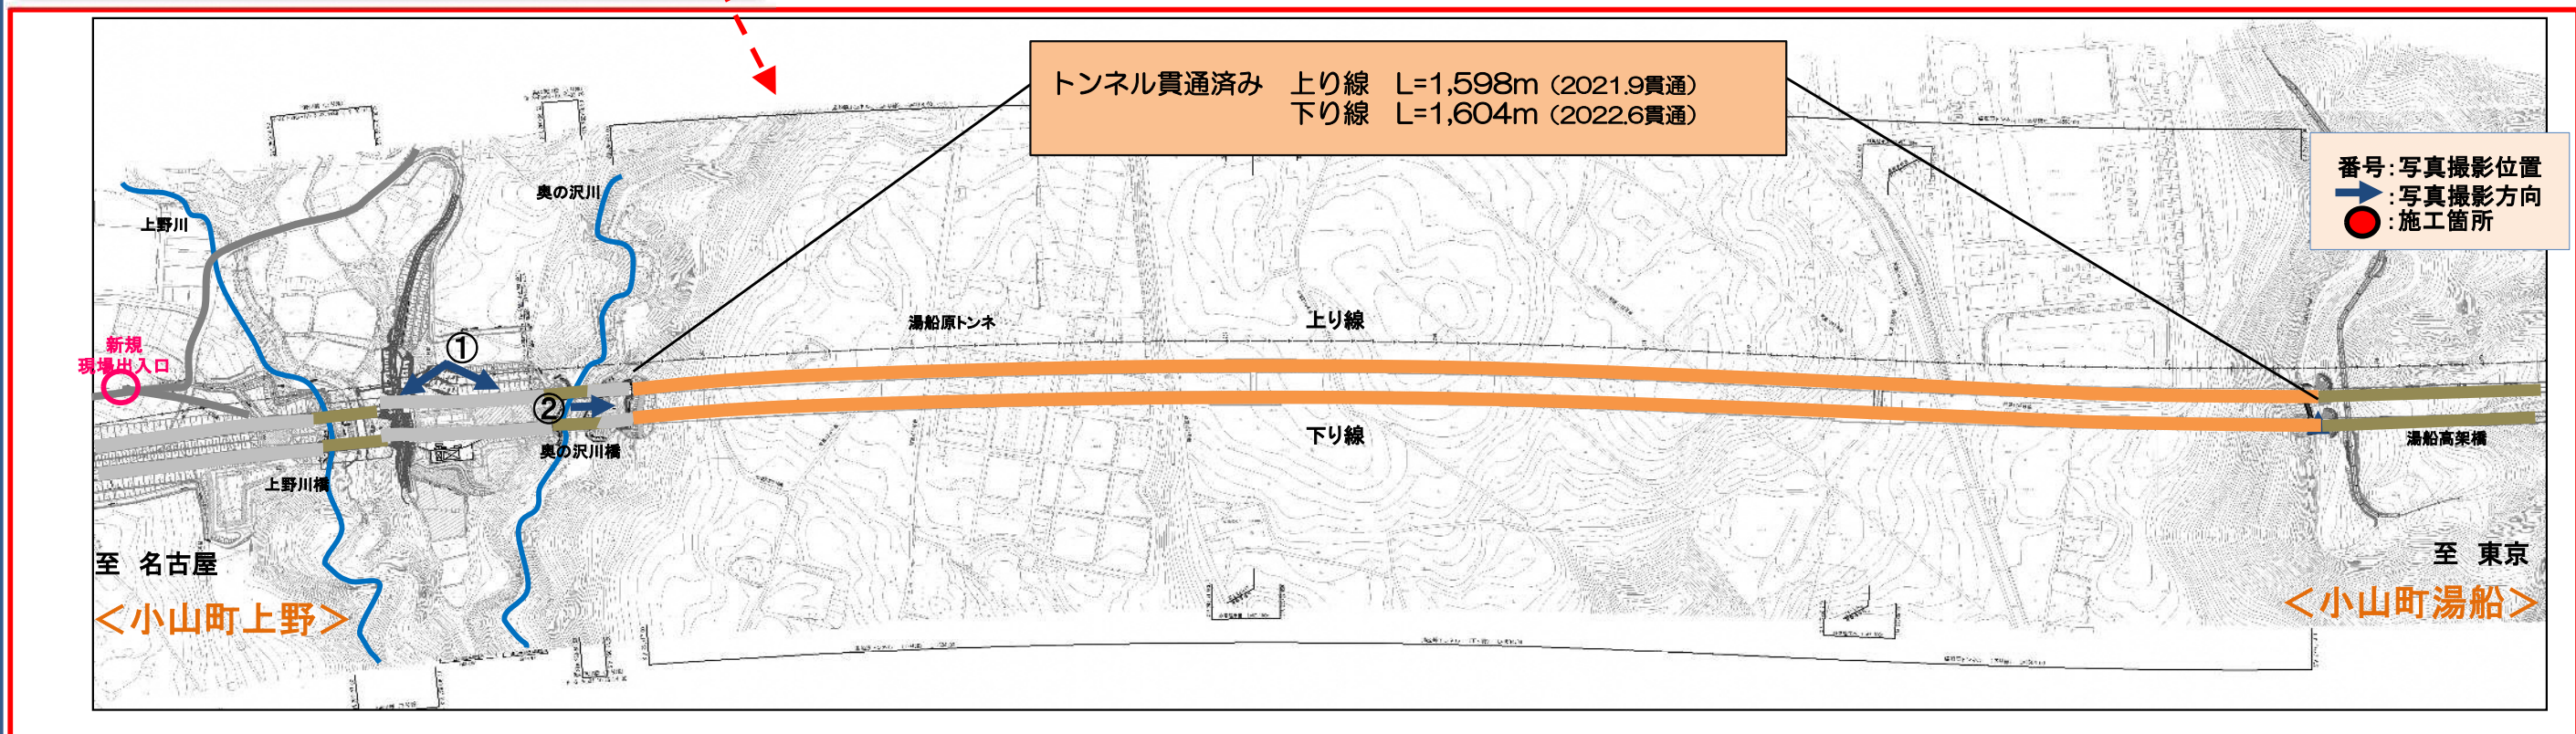

発注者

中日本高速道路株式会社  
沼津工事事務所

連絡先

西松建設(株) 湯船原工事事務所  
静岡県駿東郡小山町用沢1393-5

現場代理人 滝 敏行  
0550-88-8820
