


梅雨明けが待ち遠しい今日この頃ですが、皆さまにおかれましてはお変わりなくお過ごしでしょうか。
 平素より新東名高速道路工事にご協力いただき感謝申し上げます。
 用沢工事では、7月も本線土工事、調整池工事、付替道路工事などを実施致します。
 引き続き、地域内における工事関係車両の通行や交通規制等により、地域の皆様にはご迷惑をお掛けすることと存じますが、ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。
 お気づきの点などがございましたら、下記連絡先までご連絡お願い致します。

- 2023年7月の予定
- 掘削・土運搬・盛土(小山PA下り、大御神東跨道橋～須川支流1付近)
 - 石灰安定処理土作製、路床置換え工(小山PA下り)
 - 調整池工(須川、須川支流1、中日向調整池)
 - 付替道路工(町道阿多野大御神線、町道3727号線、町道原向中日向線、町道3106号線)
 - 付替道路工(県道須走小山線、町道3628号線、町道用沢大御神線)
 - 棚頭水源井戸設置
- 主な工事車両運行予定
- ・大型車
10tトラック・ユニック車、トレーラー、10tダンプ(30～50台)
生コン車、移動式クレーン
 - ・小型車、中型車
資機材搬入・搬出車
2～4tダンプ・トラック・ユニック車、散水車、連絡車両
- 主な使用機械
- 移動式クレーン(25～50t級:1～3台)
 - バックホウ(0.15～1.4m³級:20台程度)
 - コンクリートポンプ車(8～12t車)
 - ホーリングマシン、自走式土質改良機



状況写真

工事進捗率 93.0%(2023.6末)

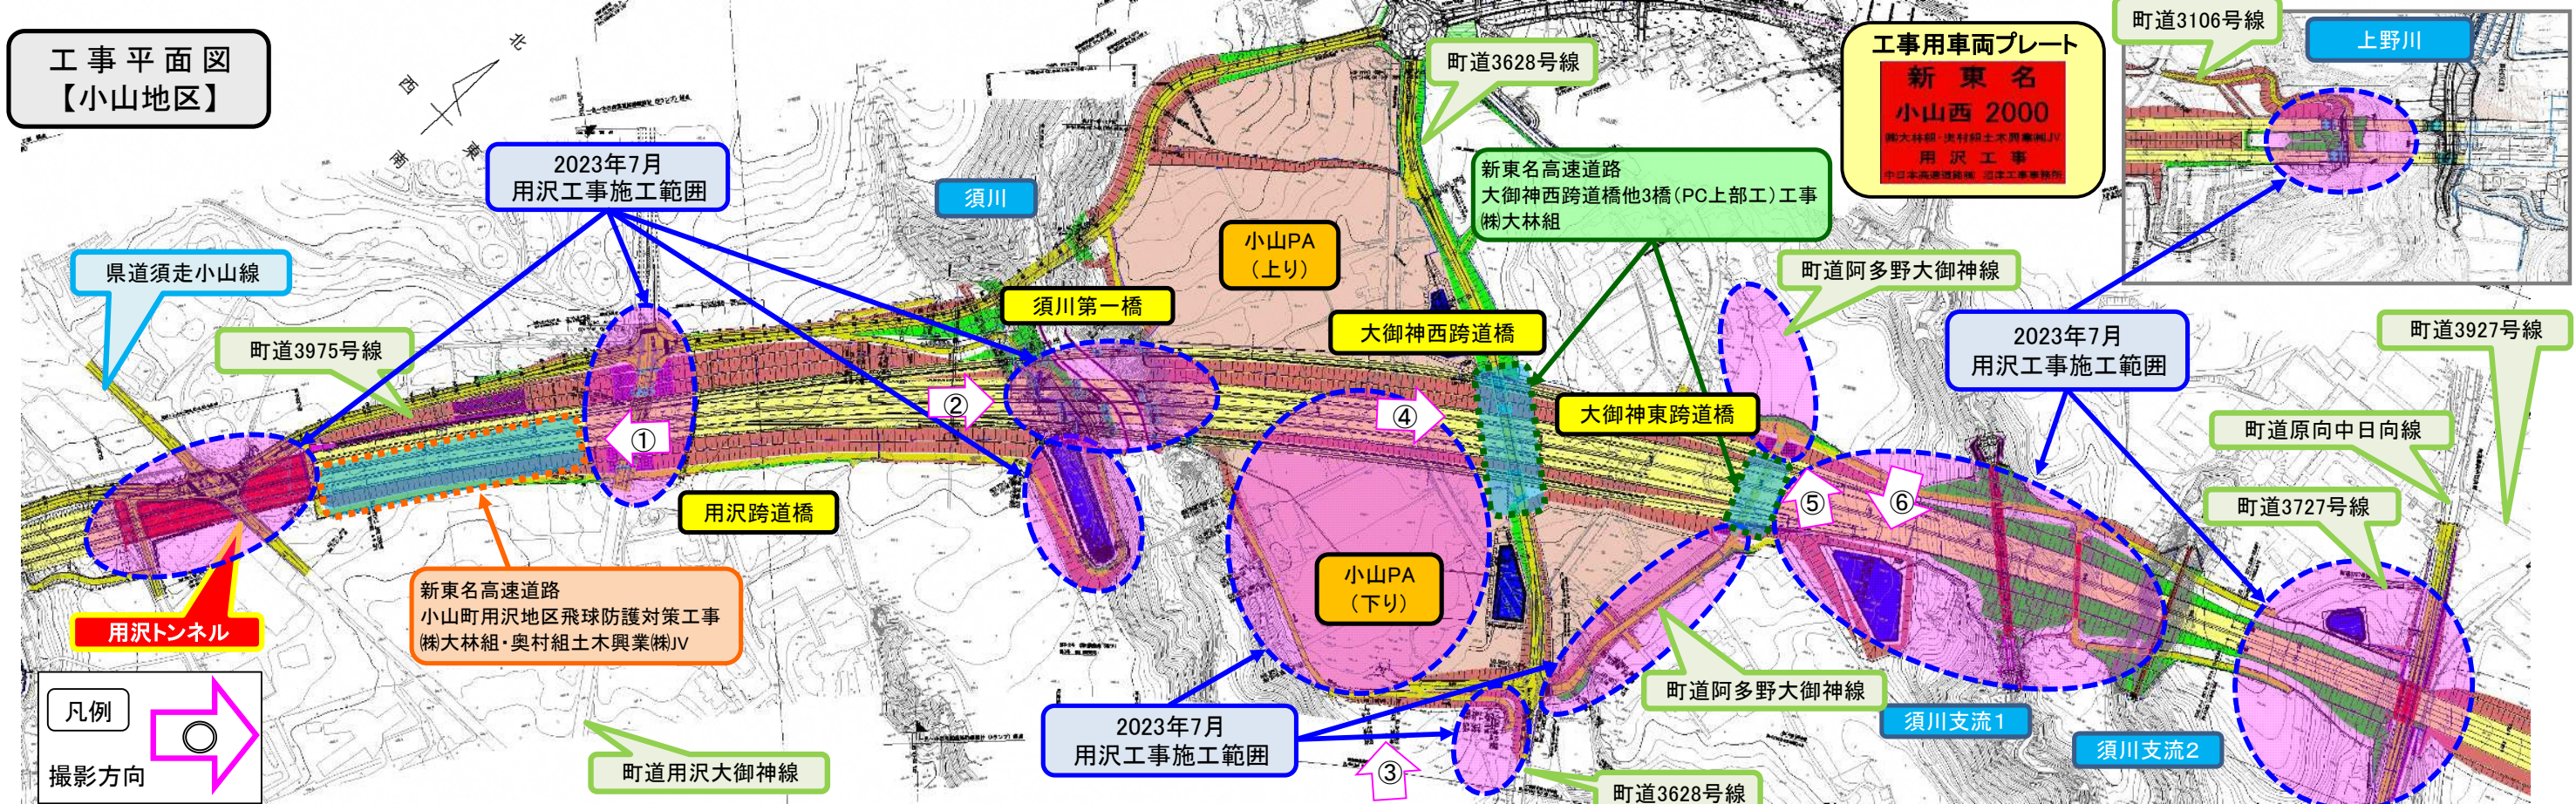

ごあいさつ

皆様におかれましては、日頃より新東名建設事業に対してのご理解とご協力を頂き、深く感謝しております。

今月は、右記の工事内容を予定しています。引き続き、上野工区現場内で掘削した土砂は、小山地区盛土場(用沢工事)へダンプで運搬します。土砂運搬時の運行マナー、ルールを遵守いたします。

なお、今後の工事で施工量が多い場合、朝7:00頃から大型車両が町道を運行することがありますことを、ご了承お願い致します。

工事期間中は、ご不便をおかけしますが安全、不要な騒音の抑制に十分配慮いたしますので、何卒ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。

2023年7月の工事内容(小山町上野)

- 本線土工、土運搬(用沢工事へ)
- 本線用排水工
- L型擁壁工
- 奥の沢川右岸調整池工
- 坑口上部 吹付工
- ブロック、重力式擁壁工
- 大型車両待避所復旧工

※主な工事車両運行予定

土砂運搬ダンプ(他業者も含む)、資機材運搬車、コンクリートミキサー車
※主な使用機械

バックホウ(0.15、0.25、0.5、0.8m³級)、10t・4tダンプトラック、高所作業車
4.9tクローラークレーン、ラフテレーンクレーン、コンクリートミキサー車、ポンプ車、吹付機

新東名
小山西 1000
西松建設株式会社
湯船原トンネル工事
中日本高速道路(株) 沼津工事事務所

●工事用車両プレート

●2023年6月度施工範囲・状況

●施工範囲



●状況写真



①西側トンネル坑口




②上野川橋左岸調整池



③下り線トンネル中央排水工



④東側下り線坑口

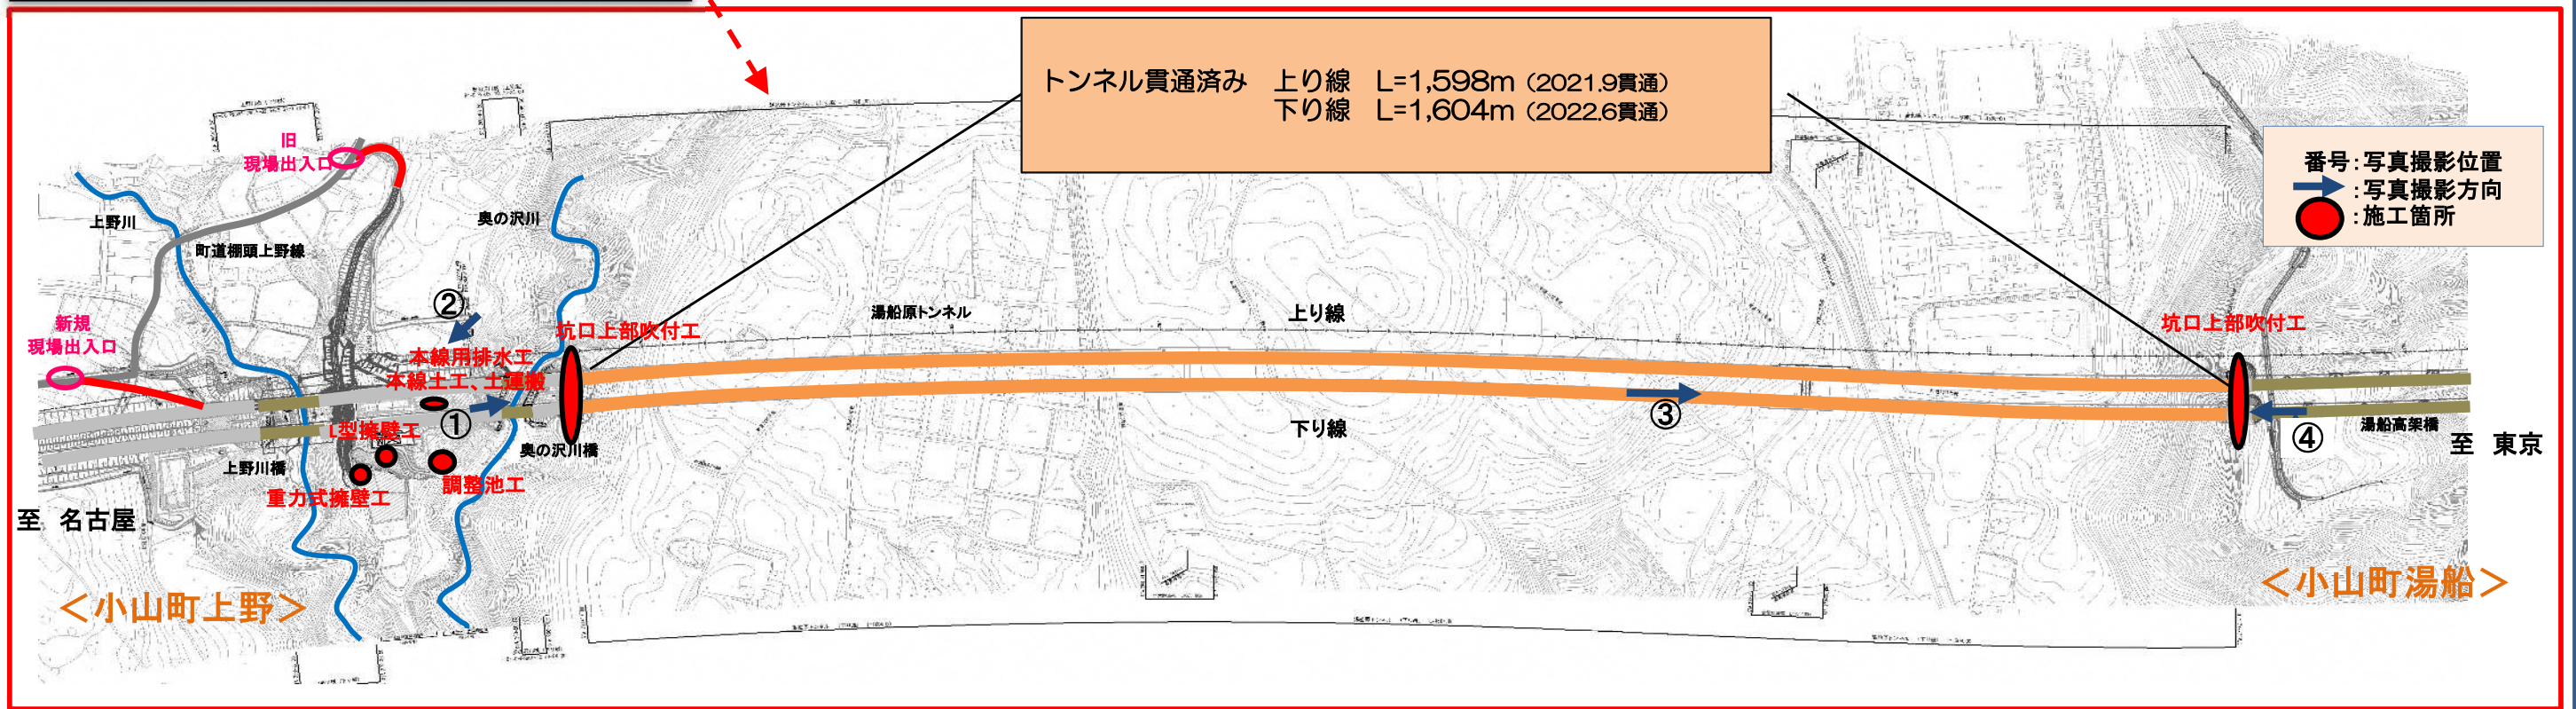

発注者 中日本高速道路株式会社 沼津工事事務所

連絡先 西松建設(株) 湯船原工事事務所 静岡県駿東郡小山町用沢1393-5

現場代理人 滝 敏行 0550-88-8820
